



Prosjektbeskrivelse ny skiskytterarena, mars 2022.

- Avtale grunneier: Det er avholdt møte med grunneier om planer for ny skiskytterarena, påviste forurensninger og behovet for å inngå en ny 30-års avtale om leie av grunn. Skilaget er glad for den positive dialogen med grunneier.
- Anleggsvei: Fra skihytta bygges en anleggsvei langs venstre side av skitrase til standplass, og videre til skivene. Geonett i bunn, bærelag av pukk/ tunellmasse i bredde 3 meter/ 20 cm tykkelse og et topplag av subus bredde 2,5 meter/ tykkelse 10 cm. Noe eksisterende masse mot senter av skitrase fjernes for at vei og skitrase skal gå i ett. Foran skiskytterarenaen lages en snuplass. Etter anleggsperiode tilsås kanter med grasfrø, og veien benyttes til sti for å ivareta krav om universell utforming.
- Opprydding av forurensing: Miljøundersøkelser utført i 2021 viser at det er mindre forekomster av bly forurenset masse ved skivene, samt noe forurensing av kobber i øvre jordlag foran standplass. Analyser av jordprøver viser at forurensingen er vesentlig mindre enn tidligere antatt, og at det ikke er påvist vesentlig forurensing av bly i vannprøver. Et tynt topplag ved skivene og lausmasser bak skivene fjernes og leveres godkjent mottak. Det lages ei avskjæringsgrøft for vann som kommer ned langs terrenget bak skivene. Gamle tomhylser foran standplass fjernes, samt at det bygges en avsats foran standplass som det enkelt kan samles opp tomhylser fra. Det etableres en til to fangdammer langs vannveier for utfelling/ oppsamling av evnt. framtidig blyforurensing. Opprydding av forurensing utføres iht. egen tiltaksplan.
- Utvidelse av skiver mot vest: Steinmasser fjernes, evnt. sprenges bort og overskuddsmasse samles i en voll til venstre for skytebanen. Denne vollen bidrar til å ivareta sikkerheten under skyting.
- Betongfundament/ takoverbygg: Nytt fundament og bakvegg av betong, samt en kant i forkant bygges for å samle opp bly for framtida. Norges Skiskytterforbund har bistått med skisse/ løsning for hvordan bly kan samles opp. Fundament og bakvegg vil ha en lengde på 45 meter for å kunne få plass til 15 skiver. Det bygges et tak over skivene og betongfundamentet med avrenning av regnvann bak fundamentet
- Skiver/ kulefangere: Det monteres 15 nye skiver og kulefangere fra Kurvinen, tilsvarende de som er montert ved Selbuskogen Skisenter.
- Nye lysarmaturer: Det monteres nye LED- armaturer som vil gi godt lys over skivene.
- Standplass: Utvides mot vest, samt at det bygges en avsats foran standplass for enklere å samle opp tomhylser.
- Planlagte dugnadsarbeider: Demontering av eksisterende skiver og anlegg, noe opprydding av forurenset masse, fjerning av vegetasjon langs ny


skytebane mot vest, bygging av takkonstruksjon, montering av nye skiver og kulefangere, elektriske installasjoner, byggesaksbehandling og oppfølging av prosjektet er tenkt utført på dugnad. Det er allerede utført betydelige dugnadsarbeider av Jon Olav Forbord/ Norsk Landbruksrådgiving i forbindelse med miljøundersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplan.

- Kostnader/finansiering per mars 2022: Hovedfinansiering er planlagt via spillemiddel ordningen. Stjørdal Kommune er i gang med å utarbeide ny idrettsplan, som trolig vil være godkjent i løpet av 1. kvartal 2023 – inntil da blir ikke nye spillemiddelprosjekt tatt inn. Stjørdal kommune har gitt forsikringer om at oppstart av prosjekt ikke vil være til hinder for søknad om spillemidler, og at prosjektet vil bli prioritert av Stjørdal kommune. Det er per dato 6 års ventetid på tildeling av spillemidler.

Kostnader:		
Totale kostnader	kr	1 092 000,00
MVA	kr	273 000,00
	kr	1 365 000,00
Finansiering		
Tippemidler	kr	692 000,00
Komunalt tilskudd	kr	69 200,00
Sponsor/ gaver		
Egenkapital	kr	603 800,00
Grunnlag MVA. refusjon	kr	273 000,00
Kostnad ved full MVA. refusjon	kr	330 800,00

Framdriftsplan:

- Byggesaksbehandling april – juni 2022
- Oppstart anleggsarbeider juni 2022.
- Ferdigstillelse september/ oktober 2022.

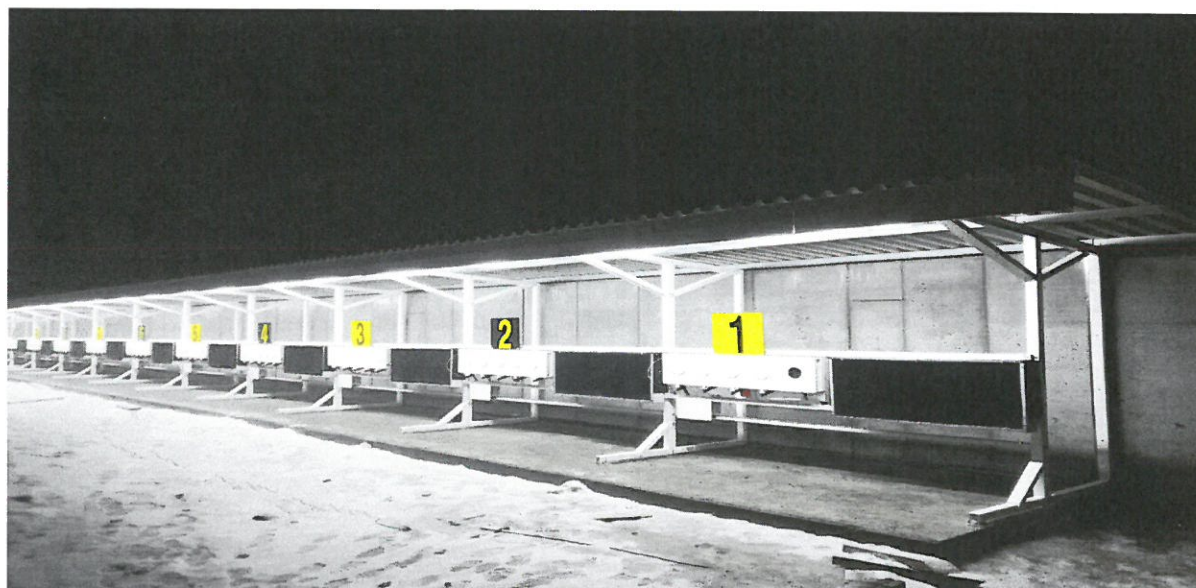



SITUASJONSKART

Eiendom:

Gnr: 41

Bnr: 1

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse: Åsvegen 132, 7510 SKATVAL, med flere

Hj.haver/Fester:



**STJØRDAL
KOMMUNE**

Dato: 19/1-2022 Sign:

Målestokk
1:1600

